


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

INFORMACIJA
O UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI
KOJIMA SU FINANSIRANI PROJEKTI UKLJUČENI U
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
2017.-2019. GODINA

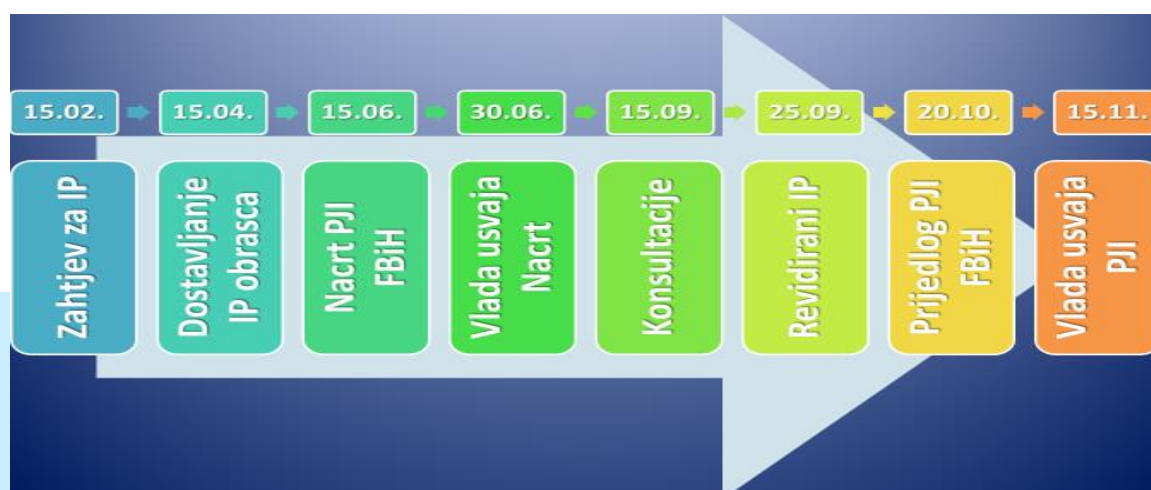

SADRŽAJ

UVOD	2
PLAN I REALIZACIJA PROJEKATA UKLJUČENIH U PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2017.-2019. GODINA	3
PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI	4
REALIZACIJA PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI PO DAC SEKTORIMA.....	4
REALIZACIJA PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI PO LOKACIJAMA	4
PROJEKTI ZAVRŠENI U 2017. GODINI	5
PROJEKTI KOJI SU 2017. GODINI DOBILI STATUS „U IMPLEMENTACIJI“	6
RAZLOZI ODSUPANJA U REALIZACIJI PROJEKATA U ODNOSU NA PLAN	7
PRILOG 1. Pregled realizacije projekata u 2017. godini sa statusom „U Implementaciji“ čija realizacija je još uvijek u toku	9
PRILOG 2. Izvještaji o napretku projekata	14

UVOD

U skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija («Službene novine Federacije BiH», broj 106/14) (u daljem tekstu: Uredba) Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija financija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) ima obavezu da, najmanje jednom godišnje, informiše Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PJI Federacije).

Navedenom Uredbom propisano je da implementaciju projekata od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koje je odobrila Vlada Federacije, te upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji tih projekata, vrše jedinice za upravljanje projektom¹. Uloga jedinice za upravljanje projektom je, između ostalog, koordinacija u identifikaciji i utvrđivanju prioriternih projekata u okviru resora, dostavljanje prioriternih projekata Ministarstvu finansija u cilju pripreme PJI Federacije, upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji projekata, te praćenje i izvještavanje o implementaciji tekućih projekata.

Izvještavanje o planu i utrošku sredstava kojima se finansira projekat, vrši se kvartalno unosom podataka u PIMIS sistem (Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama) i dostavljanjem propisanog IP obrasca Ministarstvu finansija.

Projekti u implementaciji obuhvataju, kako projekte čija je realizacija u toku, tako i projekte za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranje. Projekat koji se finansira iz više izvora tretira se kao projekat u implementaciji ukoliko su efektivna sredstva iz bilo kog od izvora.

Informacija o utrošku sredstava u 2017. godini kojima su finansirani projekti uključeni u PJI Federacije 2017.-2019. godina pripremljena je na osnovu podataka unesenih u PIMIS sistem za koje su, u skladu sa članom 17. Uredbe, jedinice za upravljanje projektom i koordinatori² dostavili potpisan i ovjeren IP obrazac Ministarstvu finansija.

Informacija sadrži pregled ulaganja u projekte po vrsti, načinu i izvoru finansiranja, DAC sektoru i lokaciji implementacije projekta, i to:

- ukupnu vrijednost projekata čija je implementacija u toku,
- ukupan iznos sredstava utrošenih za finansiranje projekata do 31.decembra 2017. godine,
- plan realizacije za 2017. godinu utvrđen PJI Federacije 2017.-2019. godina i realizaciju tog plana,
- ukupnu vrijednost projekata koji su u 2017. godini dobili status „U implementaciji“
- ukupnu vrijednost projekata završenih u 2017. godini i iznos sredstava utrošenih za njihovu realizaciju.

¹ Jedinica za upravljanje projektom u smislu navedene Uredbe je organizaciona jedinica osnovana u okviru federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, jedinice lokalne samouprave, agencije, odnosno javnog preduzeća i odgovorna je za implementaciju projekta koji je odobrila Vlada Federacije.

² Koordinator je lice ovlašteno za unos podataka o projektima u PIMIS sistem na nivou Federacije

PLAN I REALIZACIJA PROJEKATA UKLJUČENIH U PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2017.-2019. godina

U PJI Federacije 2017.-2019. godina je uključeno 80 projekata ukupne vrijednosti 12.909,25 mil. KM, od čega 40 kandidovanih (9.135,19 mil. KM) i 40 projekata čija je implementacija u toku (3.774,06 mil. KM).

Tabela 1. Realizacija projekata, zbirno, po vrsti finansiranja, u mil. KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
			Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
Ino sredstva	Kredit	2.769,86	901,53	280,52	31,12%	879,13
	Grant	177,22	24,94	18,79	75,33%	106,93
INO IZVORI UKUPNO		2.947,07	926,48	299,31	32,31%	986,07
Domaća sredstva	Budžet	232,49	32,35	0,71	2,21%	78,01
	Vlastita sredstva	594,50	119,29	45,29	37,96%	188,62
DOMAĆI IZVORI UKUPNO		826,99	151,64	46,00	30,34%	266,63
Ukupno		3.774,06	1.078,11	345,31	32,03%	1.252,69

Planirano ulaganje u 2017. godini u iznosu od 1.078,11 mil. KM realizovano je sa 32,03%.



U 2017 godini je, utroškom 280,52 mil. KM, plan finansiranja projekata iz ino kredita realizovan sa 31,12%, a utroškom 18,79 mil. KM plan finansiranja projekata iz ino grantova realizovan je sa 75,33%.

PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI

Od projekata koji su u PJI Federacije 2017.-2019. godina imali status „U implementaciji“, 35 projekata je zadržalo taj status i njihova realizacija je i dalje u toku (Prilog 1.).

Tabela 2. Zbirni pregled ulaganja u projekte u implementaciji, u mil. KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
			Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
Ino sredstva	Kredit	2.720,66	901,42	280,52	31,12%	840,25
	Grant	168,48	22,94	16,12	76,00%	65,67
INO IZVORI UKUPNO		2.889,14	924,36	296,64	32,15%	905,92
Domaća sredstva	Budžet	190,67	28,85	0,62	2,16%	51,37
	Vlastita sredstva	589,19	119,29	45,29	37,96%	183,22
DOMAĆI IZVORI UKUPNO		779,86	148,14	45,90	31,06%	234,59
Ukupno		3.625,60	1.070,42	342,54	32,00%	1.140,51

REALIZACIJA PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI PO DAC SEKTORIMA

Plan ulaganja u 2017. godini najrealnije je postavljen za projekte iz sektora „Vladin sektor i civilno društvo“. Utroškom sredstava u iznosu od 7,93 mil. KM plan je ostavaren sa 91,30%, dok je plan realizacije projekata iz sektora „Željeznički transport“, utroškom sredstava u iznosu od 16,13 mil. KM, ispunjen sa 80,25%.

Tabela 3. Realizacija projekata u implementaciji po DAC sektorima, u mil. KM

DAC Sektor	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
		Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
210 Transport i skladištenje 21020 Cestovni transport	1.732,78	515,70	157,61	30,56%	464,55
210 Transport i skladištenje 21030 Željeznički transport	211,04	20,09	16,13	80,28%	202,44
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	995,04	351,31	113,06	32,18%	257,15
140 Vodosnabdijevanje i sanitacija	304,47	77,16	4,08	5,29%	71,60
700 Humanitarna pomoć	160,74	48,72	12,60	25,86%	19,06
400 Višesektorske/uzajamno povezane aktivnosti	92,71	22,75	17,12	75,28%	70,32
312 Poljoprivreda	59,85	11,53	7,68	66,61%	16,76
323 Građevinarstvo	31,08	13,11	5,84	0,00%	0,00
150 Vladin sektor i civilno društvo	33,01	8,68	7,93	91,30%	21,16
312 Šumarstvo	4,89	1,36	0,49	36,25%	1,25
UKUPNO	3.625,60	1.070,42	342,54	32,00%	1.140,51

REALIZACIJA PROJEKATA U IMPLEMENTACIJI PO LOKACIJAMA

U 2017. godini na projekte implementirane u Zeničko-dobojskom kantonu je utrošeno 103,12 mil. KM (30,10%), u Kantonu-10 iznos od 99,17 mil. KM (28,95%), dok je na implementaciju tzv. federalnih projekata utrošeno 79,17 mil. KM ili 23,11% ukupno utrošenih sredstava u toj godini.

Tabela 4. Realizacija projekata u implementaciji po lokaciji, u mil. KM

Lokacija	Ukupna vrijednost projekta	2017			Ukupno utrošeno do 31.12.2017.
		Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
Zeničko-dobojski kanton	1.090,61	297,74	103,12	34,63%	223,01
Federacija BiH	1.053,97	241,74	79,17	32,75%	482,33
Hercegovačko-neretvanski kanton	744,94	263,65	5,61	2,13%	17,16
Kanton 10	375,43	166,55	99,17	59,55%	134,33
Kanton Sarajevo	217,95	0,70	3,11	446,20%	212,18
Unsko-sanski kanton	28,55	0,90	0,50	55,43%	1,53
Bosansko-podrinjski	15,52	5,20	1,11	21,34%	7,82
Posavski kanton	98,63	93,95	50,75	54,03%	62,15
Ukupno	3.625,60	1.070,42	342,54	32,00%	1.140,51

PROJEKTI ZAVRŠENI U 2017. GODINI

Od 40 projekata koji su u PJI Federacije 2017.-2019. godina imali status „U implementaciji“, u 2017. godini je završeno pet projekata ukupne vrijednosti 148,45 mil. KM.

Tabela 5. Završeni projekti, zbirno, u mil. KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	Ukupno utrošeno do 31 12 2017	% utrošenih sredstava
Ino sredstva	Kredit	49,80	38,88	78,07%
	Grant	44,35	41,27	93,04%
INO IZVORI UKUPNO		94,15	80,15	85,12%
Domaća sredstva	Budžet	46,99	26,64	56,69%
	Vlastita sredstva	7,31	5,39	73,80%
DOMAĆI IZVORI UKUPNO		54,30	32,03	58,99%
Ukupno		148,45	112,18	75,57%

Tabela 6. Pregled projekata završenih u 2017. godini, u mil. KM

Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Finansiranje			Ukupna vrijednost projekta	Ukupno utrošeno do završetka projekta
		Vrsta	Način	Izvor		
Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF)	Federalno ministarstvo zdravstva	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	0,82	0,82
				Budžet FBiH – javne investicije	0,65	0,06
		Ino sredstva	Kredit	CEB	10,76	10,69
				Svjetska banka - IDA	8,35	8,35
Ukupno					20,58	19,92
IPA 2011 - OTPAD	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Ino sredstva	Grant	Evropska komisija-IPA	8,73	5,65
		Ukupno				
Podrška razvoju lokalnih zajednica PRLZ	Fundacija za održivi razvoj - ODRAZ	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH – javne investicije	24,54	12,18
				Budžet općina	15,82	8,42
		Ukupno				
Glavni popravak i modernizacija 14 električnih lokomotiva	JP Željeznice Federacije BiH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	5,31	3,39
		Ino sredstva	Kredit	Ostala ino sredstva	30,09	19,24
		Ukupno				
GEF projekat zaštite kvaliteta voda u FBiH	Agencija za vodno područje rijeke Save	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	5,06	5,06
				Budžet općine - sufinansiranje	0,11	0,11
			Vlastita sredstva	Fondovi vlastito učešće	2,00	2,00
		Ino sredstva	Grant	Evropska komisija-IPA	14,43	14,43
				Svjetska banka -IBRD	13,17	13,17
				SIDA	8,02	8,02
			Kredit	Svjetska banka -IBRD	0,60	0,60
Ukupno					43,39	43,39
Ukupno					148,45	112,18

PROJEKTI KOJI SU 2017. GODINI DOBILI STATUS „U IMPLEMENTACIJI“

Osam projekata, ukupne vrijednosti 408,25 mil. KM, koji su u PJI Federacije 2017-2019. godina imali status „Kandidovan“, u 2017. godini je promijenilo status. Šest od navedenih osam projekata, ukupne vrijednosti 296,54 mil. KM, su projekti podnositelja JP Ceste Federacije BiH, za koje su u 2017. godini postala efektivna kreditna sredstva bar jednog ino kreditora.

Tabela 7. Projekti koji su u 2017. godini promijenili status iz „Kandidovani“ u „U implementaciji“, u mil. KM

DAC sektor	Naziv projekta	Podnositelj	Finansiranje			Ukupna vrijednost projekta	2017	
			Vrsta	Način	Izvor		Plan	Utrošeno
Vladin sektor i civilno društvo	Podrška zapošljavanju u Federaciji BiH	Federalno ministarstvo rada i socijalne politike	Ino sredstva	Kredit	WB IBRD	57,32	10,06	
			Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH potrošačka jedinica	51,11	10,00	
			Ukupno			108,43	20,06	
Transport i skladištenje Cestovni transport	Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH - Sanacija tunela	JP Ceste FBiH	Ino sredstva	Kredit	WB- IBRD	9,25		
					EIB	10,94		
					EBRD	2,52		
	Ukupno			22,71				
	Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH - Sanacija mostova	JP Ceste FBiH	Ino sredstva	Kredit	EBRD	7,38		
					WB- IBRD	2,99		
					EIB	3,81		
	Ukupno			14,18				
	Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH - Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta	JP Ceste FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet	0,29		
			Ino sredstva	Kredit	EIB	3,04		
					WB- IBRD	2,39		
	Ukupno			5,72				
	Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH - Izgradnja ceste-poboljšanje elemenata u postojećem koridoru	JP Ceste FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet	12,17		
			Ino sredstva	Kredit	EBRD	56,74		
					WB- IBRD	74,91		
	Ukupno			194,33				
	Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH - Rekonstrukcija ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine	JP Ceste FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet	1,44		
			Ino sredstva	Kredit	EBRD	2,45		
					WB-IBRD	5,89		
	Ukupno			17,28				
	Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH -Izgradnja traka za spora vozila	JP Ceste FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet	3,05		
			Ino sredstva	Kredit	EBRD	0		
					WB- IBRD	17,28		
	Ukupno			42,32				
Proizvodnja i snabdijevanje energijom	Studija izvodljivosti (ESIA, CBA i Idejni projekat) za Regionalni gasovod	BH-Gas	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javno preduzeće	3,00	1,00	
				Grant	Evropska komisija	0,28	0,28	
			Ukupno			3,28	1,28	
UKUPNO						408,25	21,34	

RAZLOZI ODSUPANJA U REALIZACIJI PROJEKATA U ODNOSU NA PLAN

Imajući u vidu da je realizacija projekata i u proteklim godinama značajno odstupala od ulaganja planiranih PJI Federacije, Vlada Federacije je svojim Zaključkom V broj 1085/2017 od 27.07.2017. godine obavezala implementirajuće agencije/institucije, da, osim redovnog kvartalnog ažuriranja podataka u PIMIS sistemu, Federalnom ministarstvu dostavljaju i Izvještaj o realizaciji projekata za koje je nadležno, sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja, kao i o zastoja u realizaciji projekata.

S tim u vezi implementatori su, na zahtjev Ministarstva finansija, na posebnom obrascu (Prilog 2.) dostavili Izvještaje o realizaciji projekata koji sadrže podatke o planiranim i provedenim aktivnostima, te razloge odstupanja od planiranih ulaganja i zastoja u realizaciji projekta, ukoliko ih je bilo.

Na osnovu podataka unesenih u PIMIS sistem i dostavljenih izvještaja o realizaciji projekata (27) ukazujemo na sljedeće:

- Procenat realizacije plana ulaganja u 2017. godini u projekte uključene u PJI Federacije 2017-2019. godina iznosi 32,03% (procenat realizacije plana ulaganja ino sredstava iznosi 32,31% /kreditni 31,12%, grant 75,33%/, a procenat realizacije plana ulaganja domaćih sredstava 34,30% /budžeti svih nivoa 2,21% i vlastita sredstva JP 37,96%/);
- Od 1.070,42 mil. KM planiranih ulaganja u 2017. godini 81,00% se odnosi na projekte iz dva sektora: Cestovni transport (u okviru DAC sektora 210) i Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom (DAC sektor 230).
- Ulaganjem 867,01 mil. KM plan ulaganja u 2017. godini u projekte u oblasti cestovnog prometa i proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom ostvaren je sa 31,22%;
- Plan ulaganja u projekte iz svih drugih sektora (203,41 mil. KM) je, utroškom 71,87 mil. KM, realiziran sa 35,33%.

Kao osnovne razloge odstupanja ili zastoja u realizaciji projekata implementatori navode:

➤ U sektoru cestovnog transporta:

- potpisivanje sporazuma i efektivnost kredita vezana za povećanje akcize na gorivo
 - poddionice na Koridoru Vc: Tunel Zenica-Donja Gračanica (tunel Pečuj), Nemila-Vranduk, Buna-Počitelj, Kvanj-Buna; tunel Zebnica; Vranduk- tunel Zenica
- Poništavanje međunarodnog tendera:
 - Poddionica Počitelj-Zvirovići na Koridoru Vc
- Korekcije planiranih aktivnosti - pomjeranje linije eksproprijacije zbog geološkog sastava trase
 - Klizišta na prvobitno lociranoj trasi poddionice Drivuša-Klopče na Koridoru Vc
 - Neadekvatan sastav trase na poddionici Donja Gračanica (Tunel Pečuj)-Klopče
- Problemi u pribavljanju odobrenja za građenje (granični prelaz Svilaj);

➤ **U sektoru Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom**

- administrativne smetnje za dodjelu koncesije, spore i komplikovane procedure ishoda potrebnih dozvola, eksproprijaciju (CHE Vrilo, VE Mesihovina, HE Janjići)
- Neusaglašenost ili nepostojanje adekvatnog pravnog okvira
- Nepostojanje dokumenata prostornog planiranja
- Preklapanja i neusklađenost ovlasti različitih nivoa vlasti
- Potreba iznalaženja dodatnih izvora finansiranja zbog značajnog povećanja ukupne vrijednosti projekta (prema idejnom projektu) u odnosu na vrijednost iz Studije izvodljivosti za projekat HE Janjići
- Potreba za reafirmacijom ugovora sa postojećim izvođačem ili izbor novog izvođača (HE Vranduk)
- Problemi u isporuci najnovijih SCADA sistema i u pravu korištenja određenih softverskih alata;

➤ **Ostali sektori**

- Izmjena trase izvođenja radova (Projekat razvoja navodnjavanja)
- Nepredviđeni dodatni radovi uzrokovani obrušavanjem zemljišta zbog ekstremno visokog/ niskog vodostaja rijeke Drine (Projekat razvoja navodnjavanja)
- Dodatna oštećenja na već pripremljenim gradilištima uzrokovani novim obilnim padavinama (Projekat zaštite od poplava Drine)
- Neriješeni imovinsko-pravni odnosi u općinama uzrokuju dugotrajne procedure eksproprijacije (Projekat razvoja navodnjavanja, WATSAN-Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH)
- Nespremnost općina pri izradi tehničke dokumentacije (projektni zadaci, studije izvodljivosti, idejni projekti)
- Žalbeni procesi na postupak javnih nabavki (WATSAN)
- Nedovoljni kadrovski i tehnički kapaciteti implementatora.

Navedeni razlozi mogu se svesti na sljedeće:

- Nedovoljni tehnički i kadrovski kapaciteti u resornim ministarstvima za kvalitetnu pripremu projekata
- Nerealni planovi implementacije projekta u pogledu dinamike, organizacije i njihovog finansiranja;
- Projekti nemaju zaokruženu finansijsku konstrukciju što prouzrokuje kašnjenje u njihovoj realizaciji;
- Složene administrativne procedure u pribavljanju odgovarajućih dozvola i odobrenja,
- Slabi upavljački i implementacioni kapaciteti,
- Neadekvatan nadzor i praćenje implementacije projekata.

PRILOG 1. Pregled realizacije projekata u 2017. godini sa statusom „U Implementaciji“ čija realizacija je još uvijek u toku, u mil. KM

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA	Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - potrošačka jedinica	2,69	0,38	0,11	28,17%	2,42
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka-WB IBRD	18,29	7,85	0,94	12,02%	5,77
						Svjetska banka – WB IDA	12,38	2,12	0,21	10,06%	6,32
				Ukupno			33,36	10,34	1,26	12,21%	14,51
	Vodopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	1,50	0,50	0,003	0,67%	0,06
						Budžet FBiH - javne investicije	31,21	17,23			0,00
						Budžet općine - sufinansiranje	101,23	8,98	0,00		6,26
				Ino sredstva	Grant	Evropska komisija IPA	26,85	0,00	0,00		24,74
						SIDA	0,92	0,00			0,83
						Kredit	EIB	109,40	40,11	2,82	7,02%
Ukupno			271,11	66,82	2,82	4,22%	57,09				
140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA Ukupno							304,47	77,16	4,08	5,29%	71,60

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	Projekat registracija nekretnina	Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove	FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	0,55		0,03		0,53
					Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	3,27	1,00	1,08	107,73%	1,76
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - IDA	25,73	7,00	5,62	80,25%	14,63
				Ukupno			29,55	8,00	6,72	84,01%	16,92
	Tehnička pomoć za unapređivanje investicijske klime i institucijsko jačanje	Federalna uprava za inspeksijske poslove	FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - potrošačka jedinica	0,12	0,10	0,00	0,00%	0,21
				Ino sredstva	Grant	SIDA	3,34	0,58	1,21	206,53%	4,03
Ukupno			3,46	0,68	1,21	176,53%	4,24				
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO Ukupno							33,01	8,68	7,93	91,30%	21,16

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Sarajevska obilaznica	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	40,00				40,00
				Ino sredstva	Kredit	EBRD	73,53				73,53
						EIB	72,09	0,70	3,11	446,20%	65,52
						OPEC fond	32,34				33,13
						Ukupno	217,95	0,70	3,11	446,20%	212,18
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Nemila - Vranduk, dionica Nemila - Zenica (Klopče)	JP Autoceste FBiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	21,75	4,89	0,00	0,00%	0,00
				Ino sredstva	Kredit	Kuvajt	70,41		0,00		0,00
				Ukupno	92,16	4,89	0,00	0,00%	0,00		
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Donja Gračanica (tunel Pečuj) -Klopče, dionica Nemila – Zenica (Klopče)	JP Autoceste FBiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	33,29	10,44	10,68	102,27%	27,17
				Ino sredstva	Kredit	EBRD	70,41				0,00
						OPEC fond	117,35	61,41	61,32	99,85%	81,23
						Ukupno	221,05	71,85	72,00	100,20%	108,40
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Svilaj – Odžak II faza izgradnje	JP Autoceste FBiH	PK	Ino sredstva	Kredit	EBRD	78,23	78,23	43,38	55,45%	43,38
				Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	20,39	15,71	7,37	46,93%	18,77
				Ukupno	98,63	93,95	50,75	54,03%	62,15		
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Buna-Počitelj, dionica Mostar jug-Zvirovići	JP Autoceste FBiH	HNK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	21,44	7,72	4,09	53,01%	4,09
				Ino sredstva	Kredit	EBRD	58,67	23,42		0,00%	0,00
				Ukupno	80,11	31,14	4,09	13,15%	4,09		
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Počitelj-Zvirovići, dionica Mostar jug - Zvirovići	JP Autoceste FBiH	HNK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	69,38		0,16		3,68
				Ino sredstva	Kredit	EIB	195,58	60,88		0,00%	0,00
Ukupno				264,96	60,88	0,16	0,27%	3,68			
Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Kvanj-Buna, Dionica Mostar jug -Zvirovići	JP Autoceste FBiH	HNK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	41,40	13,51	0,00	0,00%	0,00	
			Ino sredstva	Kredit	EIB	195,58	62,20	0,00	0,00%	0,00	
			Ukupno	236,99	75,70	0,00	0,00%	0,00			
Izgradnja autoceste na koridoru Vc, Poddionica Vranduk-tunel Zenica, dionicaNemila- Zenica (Klopče)	JP Autoceste FBiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	25,09	9,57	2,44	25,46%	2,44	
			Ino sredstva	Kredit	OPEC fond	95,84	30,41	0,00	0,00%	0,00	
			Ukupno	120,93	39,98	2,44	6,09%	2,44			
Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica tunel Zenica, dionica Nemila- Zenica (Klopče)	JP Autoceste FBiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	34,40	11,55	0,77	6,65%	0,77	
			Ino sredstva	Kredit	EIB	148,64	47,82	0,00	0,00%	0,00	
			Ukupno	183,05	59,37	0,77	1,29%	0,77			
Koridor Vc (Drivuša - Klopče)	JP Autoceste FBiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	15,08		3,53		14,25	
			Ino sredstva	Kredit	Kuvajt	55,46	12,90	20,10	155,81%	45,34	
			Ukupno	70,54	12,90	23,62	183,16%	59,59			
Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Tunel Zenica-Donja Gračanica (tunel Pečuj), dionica Nemila-Zenica (Klopče)	JP Autoceste FBiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	48,62	15,20	0,67	4,40%	11,26	
			Ino sredstva	Kredit	EBRD	97,79	49,14		0,00%	0,00	
			Ukupno	146,41	64,34	0,67	1,04%	11,26			
Regionalni projekat obnove željeznica u BiH /Željeznice II/	JP Željeznice Federacije BiH	FBiH	Ino sredstva	Kredit	Grant	Evropska komisija-IPA	12,71	1,48	1,21	81,58%	12,44
					EBRD		82,14	4,99		0,00%	73,28
					EIB		100,92	10,09	10,09	100,00%	100,92
					OPEC fond		15,27	3,53	4,83	136,88%	15,80
					Ukupno	211,04	20,09	16,13	80,28%	202,44	
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno							1.943,82	535,80	173,74	32,43%	666,99

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31.12.2017	
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana		
230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM	POWER IV - EP BiH - Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije	JP EP BiH	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	3,62	1,10	0,02	1,77%	0,22	
				Ino sredstva	Grant	KfW	5,07	0,55	0,17	30,77%	1,63	
					Kredit	KfW	9,25	6,98	0,00	0,00%	0,00	
				Ukupno							17,93	8,63
	Izgradnja Vjetroelektrana Podveležje 1	JP EP BiH	HNK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	34,97	16,20	1,36	8,38%	8,74	
				Ino sredstva	Grant	KfW	0,78	0,00	0,00		0,65	
					Kredit	KfW	127,13	79,73	0,00	0,00%	0,00	
				Ukupno							162,88	95,93
	Izgradnja HE Vranduk na rijeci Bosni - 20 MW	JP EP BiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	22,49		0,99		10,59	
				Ino sredstva	Kredit	EBRD	68,45	41,90	2,49	5,94%	24,98	
						EIB	55,74		0,00		0,00	
				Ukupno							146,69	41,90
	HE Una Kostela - rekonstrukcija i proširenje	JP EP BiH	USK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	10,75	0,90	0,08	8,69%	0,69	
				Ino sredstva	Kredit	Ostala domaća sredstva	16,96				0,00	
						EBRD	0,84		0,42		0,84	
				Ukupno							28,55	0,90
	HE Janjici - na rijeci Bosni -15,75 MW	JP EP BiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	4,79	0,00	0,15		3,30	
				Ino sredstva	Grant	KfW	1,58	0,00			1,68	
					Kredit	KfW	57,06	2,50		0,00%	0,00	
				Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	46,35	0,00			0,00	
	Ukupno							109,79	2,50	0,15	5,94%	4,99
	SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom	JP EP HZ HB	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	2,52				0,00	
				Ino sredstva	Grant	KfW	3,52	0,13	0,93	739,25%	1,26	
					Kredit	KfW	6,47	5,55	0,00	0,00%	0,00	
				Ukupno							12,52	5,67
	Izgradnja vjetroelektrane Mesihovina u okviru finacijske suradnje Njemačke i BiH	JP EP HZ HB	K 10	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	17,72	2,70	6,65	246,23%	7,90	
				Ino sredstva	Grant	KfW	1,96				1,96	
Kredit					KfW	138,86	99,97	92,36	92,39%	121,92		
Ukupno							158,54	102,67	99,01	96,44%	131,78	
Distribucija električne energije - "Pametna brojila"	JP EP HZ HB	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	43,46	3,80	5,26	138,46%	41,58		
			Ino sredstva	Kredit	EIB	39,12	19,56	2,02	10,34%	2,02		
			Ukupno							82,58	23,36	7,28
Crpna hidroelektrana Vrilo	JP EP HZ HB	K 10	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	20,09	5,00	0,00	0,00%	1,38		
			Ino sredstva	Grant	KfW	1,22	0,21	0,16	77,92%	1,18		
				Kredit	KfW	195,58	58,67	0,00	0,00%	0,00		
			Ukupno							216,89	63,89	0,16
Električna distribucija BiH	JP EP BiH	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	29,34	0,00			24,63		
			Ino sredstva	Kredit	EIB	29,34	5,87			0,00		
			Ukupno							58,67	5,87	
230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM Ukupno							995,04	351,31	113,06	32,18%	257,15	

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
311 POLJOPRIVREDA	Projekat razvoja navodnjavanja	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	0,64				0,64
					Budžet	Budžet FBIH- javne investicije	4,08	0,19	0,14	71,36%	0,76
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka -WB IDA	31,45	1,08	0,77	71,36%	7,96
				Ukupno			36,16	1,27	0,90	71,36%	9,36
	Projekat razvoja ruralnog poslovanja (RBDP)	Ured za koordinaciju projekata u poljoprivredi	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	2,78	0,97	0,22	22,50%	0,24
					Grant	IFAD	0,66	0,23	0,12	53,32%	0,17
				Ino sredstva	Kredit	IFAD	10,91	3,82	4,65	121,87%	5,21
						OPEC fond	9,34	5,24	1,78	33,97%	1,78
				Ukupno			23,68	10,26	6,77	66,02%	7,40
	311 POLJOPRIVREDA Ukupno							59,85	11,53	7,68	66,61%

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
312 ŠUMARSTVO	Projekat održivog upravljanja šumama i krajolicima	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBIH	Ino sredstva	Grant	Svjetska banka-WB IBRD	4,81	1,36	0,49	36,28%	1,25
				Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH – javne investicije	0,08	0,00	0,00	0,00%	0,00
				Ukupno			4,89	1,36	0,49	36,25%	1,25
312 ŠUMARSTVO Ukupno							4,89	1,36	0,49	36,25%	1,25

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
323 GRAĐEVINARSTVO	Projekat energetska efikasnost	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	FBIH	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka –WB IDA	31,08	13,11	5,84	44,51%	16,22
				Ukupno			31,08	13,11	5,84	44,51%	16,22
323 GRAĐEVINARSTVO Ukupno							31,08	13,11	5,84	44,51%	16,22

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
400 VIŠESEKTORSKE / UZAJAMNO POVEZANE AKTIVNOSTI	Projekat hitnog oporavka od poplava	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBIH	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka – WB IDA	77,19	17,55	16,02	91,25%	62,50
				Ukupno			77,19	17,55	16,02	91,25%	62,50
	Projekat zaštite od poplava Drine	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	BPK	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka -WB IDA	15,47	5,19	1,11	21,34%	7,82
				Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH – javne investicije	0,05	0,00	0,00	0,20%	0,00
				Ukupno			15,52	5,20	1,11	21,34%	7,82
400 VIŠESEKTORSKE / UZAJAMNO POVEZANE AKTIVNOSTI Ukupno							92,71	22,75	17,12	75,28%	70,32

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj / implementator	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	2017			Ukupno utrošeno do 31 12 2017
								Plan	Utrošeno	% realizacije plana	
700 HUMANITARNA POMOĆ	Regionalni stambeni program	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	FBIH	Ino sredstva	Grant	CEB	69,44	16,67	11,82	70,95%	13,86
				Ukupno			69,44	16,67	11,82	70,95%	13,86
	Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	0,57	0,14	0,13	88,86%	0,25
				Ino sredstva	Kredit	CEB	79,06	27,67	0,16	0,56%	0,16
				Ukupno			79,63	27,81	0,28	1,01%	0,41
	Rekonstrukcija i obnova	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	FBIH	Ino sredstva	Kredit	Saudijski fond za razvoj	11,66	4,24	0,49	11,65%	4,79
				Ukupno			11,66	4,24	0,49	11,65%	4,79
700 HUMANITARNA POMOĆ Ukupno							160,74	48,72	12,60	25,86%	19,06

PRILOG 2. Izveštaji o napretku projekata

(Izveštaji implementatora o planiranim i provedenim aktivnostima, te o razlozima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekat ili zastoja u njegovoj realizaciji)
